


Název	
Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň	
HLAVNÍ MILNÍKY	
Předání a převzetí staveniště	
uvolnění 2.NP katedry chemie	
I.etapa - dokončení katedry chemie 2.NP	
přestěhování katedry chemie z 1.NP do 2.NP	
V.etapa - dokončení katedry chemie 1.NP	
přestěhování katedry chemie do 1.NP	
II.etapa - část - dokončení akustických úprav 3.NP	
II.etapa - část - dokončení krovu	
III.etapa - dokončení atrií	
IV.etap - dokončení vstupu a suterenu	
VI.etapa - dokončení akustických úprav 2.NP	
Předání a převzetí provedeného díla	
Realizace	
I.etapa	
2.NP - katedra chemie	
Bourací práce	
Profese	
Povrchy a kompletace	
Kompletace	
3.NP	
Podkroví	
II.etapa	
3.NP - akustické podhledy a obklady - DFPE, SO, CŽV	
Stropy 3.NP	
Strop - bourací práce	
Strop - sanace	
Krov	
Krov - bourací práce	
Krov - sanace	
Krov	
III.etapa	
Bourací práce	
Atrium východ 114	
Atrium západ 111	
1.PP	
Atrium východ 114	
Atrium západ 111	
Atria	
Atrium východ 114	
Atrium západ 111	
Podkroví	

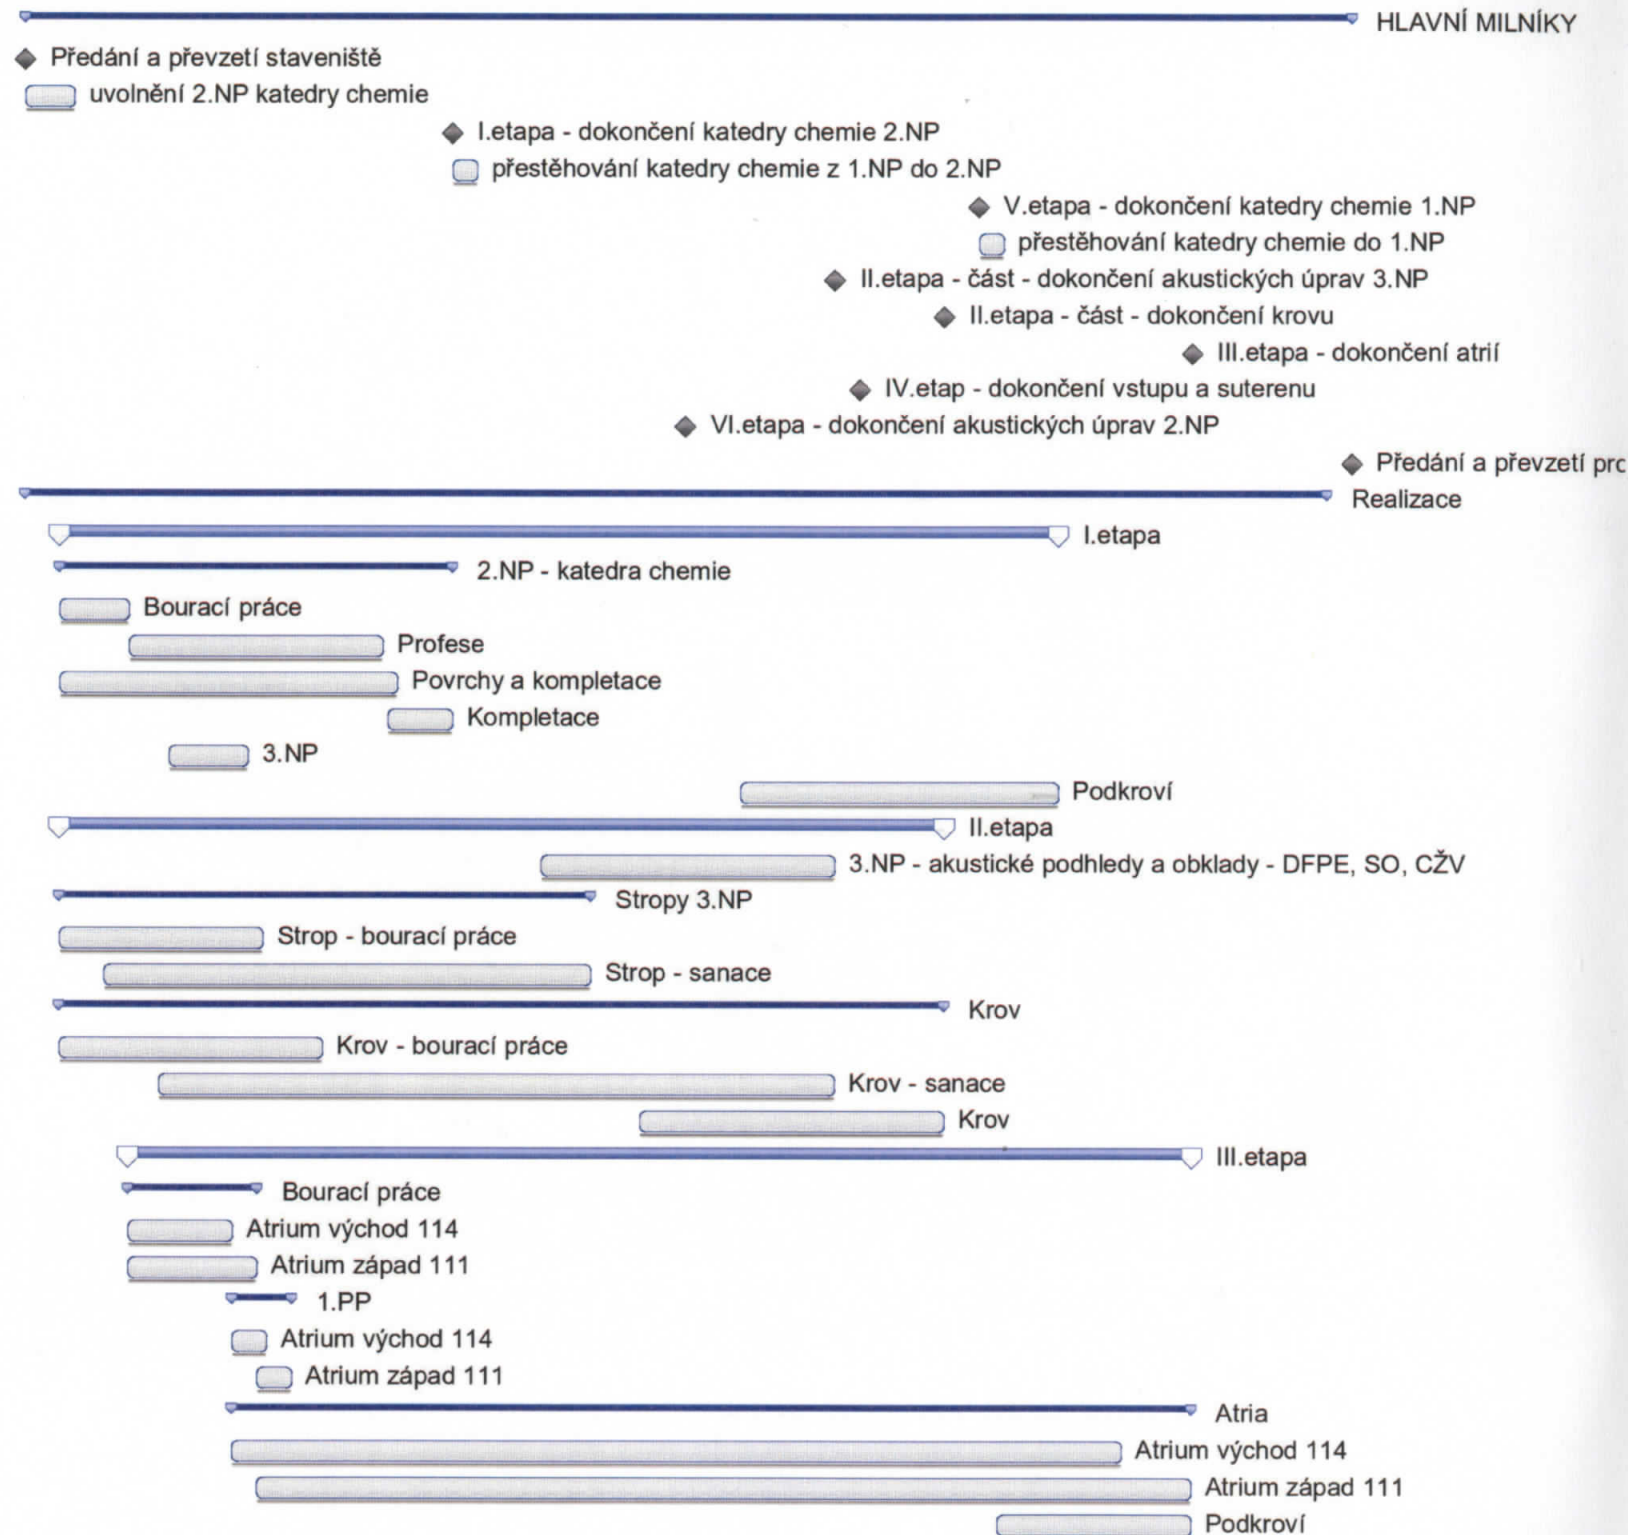

Název	
IV.etapa	IV.etapa
Bourací práce	Bourací práce
1.PP - 011, 011a, 011b, 012	1.PP - 011, 011a, 011b, 012
1.NP - 103, 115, 108 chodby	1.NP - 103, 115, 108 chodby
1.NP - úprava vstupu	1.NP - úprava vstupu
Repase	Repase
1.PP - 011, 011a, 011b, 012	1.PP - 011, 011a, 011b, 012
1.NP - 103, 115, 108 chodby suterénu	1.NP - 103, 115, 108 chodby suterénu
1.NP - úprava vstupu	1.NP - úprava vstupu
Dvůr	Dvůr
Kompletace	Kompletace
V.etapa	V.etapa
1.NP - katedra chemie	1.NP - katedra chemie
Bourací práce	Bourací práce
Profese	Profese
Povrchy a kompletace	Povrchy a kompletace
Kompletace	Kompletace
Podkroví	Podkroví
VI.etapa	VI.etapa
2.NP - akustické podhledy - učebny KHI, KČJ a KRF	2.NP - akustické podhledy - učebny KHI, KČJ a KRF
Kompletace	Kompletace
Ukončení montážních prací	Ukončení montážních prací
Individuální zkoušky technologie	Individuální zkoušky technologie
IZ - EZ silnoproud	IZ - EZ silnoproud
IZ - EZ SLABOproud	IZ - EZ SLABOproud
IZ - VZT a MaR	IZ - VZT a MaR
IZ - ÚT	IZ - ÚT
Ukončení IZ	Ukončení IZ
Převzetí objektu	Převzetí objektu
Komplexní zkoušky technologie	Komplexní zkoušky technologie
Přejímací řízení	Přejímací řízení
Odstraňování vad a nedodělků	Odstraňování vad a nedodělků
Předání stavby, uvedení do provozu	Předání stavby, uvedení do provozu

- ◆ Ukončení montážních prací
- ▶ Individuální zkoušky technologie
- IZ - EZ silnoproud
- IZ - EZ SLABOproud
- IZ - VZT a MaR
- IZ - ÚT
- ◆ Ukončení IZ
- ▶ Převzetí objektu
- Komplexní zkoušky technologie
- Přejímací řízení
- Odstraňování vad a nedodělků
- ◆ Předání stavby, uvedení do provozu
